



中国扶贫基金会九寨沟地震灾后重建项目 2018 第四季度工作报告

灾害救援部

2018 年 12 月

目 录

一、项目简介.....	1
(一) 项目背景.....	2
(二) 项目目标.....	2
二、项目实施.....	3
(一) 项目调研.....	3
(二) 项目执行.....	3
1. 农房改造项目.....	4
2. 平武县水晶幼儿园项目.....	5
3. 溪桥工程项目.....	16
4. visa 培训项目.....	18
5. 爱心包裹项目.....	20
6. 百美村宿项目.....	23
7. 校园减灾教室项目.....	25
8. 第一救援人项目.....	26
9. 电商扶贫项目.....	29
10. 暖冬行动项目.....	31
11. 弘慧行知教育项目.....	33

一、项目简介

(一)项目背景

2017年08月08日21时19分46秒在四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震中位于九寨沟核心景区西部5公里处比芒村，震中东距九寨沟县城永乐镇39公里、南距松潘县66公里、东北距舟曲县83公里、东南距文县85公里、西北距若尔盖县90公里，东偏北距陇南市105公里，南距成都市285公里。此次地震最大烈度为九度，六度区及以上总面积为18295平方千米，共造成四川省、甘肃省8个县受灾，包括四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县、若尔盖县、红原县、松潘县，绵阳市平武县，甘肃省陇南市文县，甘南藏族自治州舟曲县、迭部县(8个县均为国家级贫困县)。

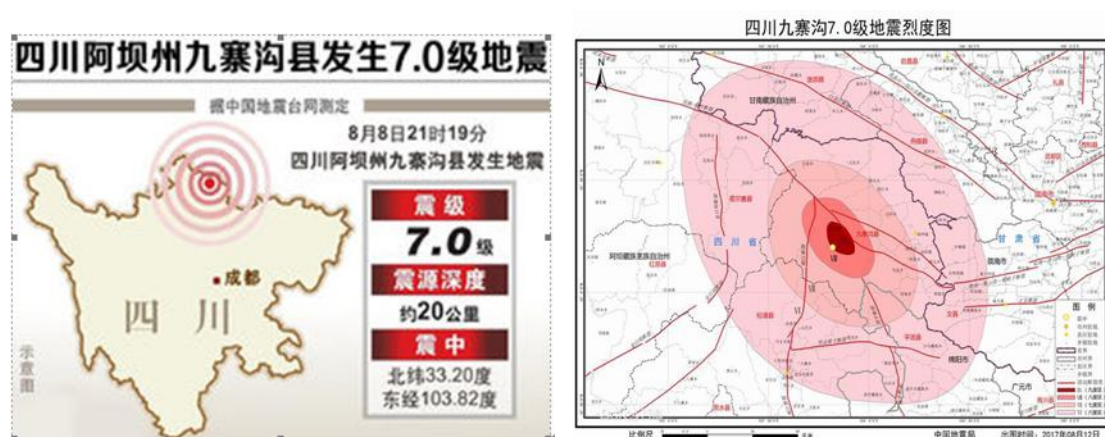


图1 九寨沟7.0级地震示意及剧烈度图

(二)项目目标

“8·8”九寨沟地震灾后重建主要在基础设施领域和教育助学领域开展项目，主要包含农房改造补贴项目、平武县水晶幼儿园项目、溪桥工程项目、visa培训项目、爱心包裹项目、美丽乡村项目、校园减灾教室项目、社区第一救援人项目、电商扶贫、暖冬行动等项目，期望帮助地震灾区的受灾群众重建家园，恢复生计，提高收入。

二、项目实施

（一）项目调研

为准确、有效地了解灾区群众的实际困难，了解灾后重建的真实需求，掌握一手资料，科学制定重建策略，提高善款使用效率，助力灾区做好灾后重建工作，中国扶贫基金会邀请西南科技大学相关专家与中国扶贫基金会专业项目人员组成联合调研评估工作组，于2017年8月14日至8月19日前往灾区进行了灾后重建需求调研和评估。评估工作组一行9人先后走访了九寨沟县、文县和平武县部分灾区，通过现场勘查、农户访谈、当地政府部门交流，以及资料分析和研究，对受损情况、灾区群众的重建需求、经济和社区发展、目前面临的困难和挑战等进行了初步的调查评估，并对中国扶贫基金会及其他社会组织

介入灾后重建工作提出了建议,为未来灾后重建的项目规划提供参考。



图2 灾后重建调研

（二）项目执行

截至2018年7月31日,中国扶贫基金会共筹集九寨沟地震善款3310.34万元,项目支出448.72万元,待支出资金2861.62万元。

1. 农房改造项目

为有效助推地震受灾地区的灾后重建及脱贫攻坚任务,我会在紧急救援及过渡安置阶段通过以工代赈的方式帮扶九寨沟县、平武县建档立卡户及房屋因灾受损户,对农户危(破)旧房屋进行改造,具体实施内容包括房屋内外墙体粉刷、木结构打磨上漆、屋内地面硬化、贴地砖、堂屋和房间吊顶、部分墙体拆改为砖墙、院坝硬化、改厨改厕等。项目主要在于平武和

九寨沟两县执行，根据项目县的实际情况分别设置了项目标准。共提供项目资金4351360.22元，其中九寨沟县2362860.22元，平武县1988500.00元。

平武县资助标准及资金匹配表

资助标准	资助标准 (元/户)	数量(户)	合计(元)	备注
一类标准	16000	26	416000	/
二类标准	8500	185	1572500	/
合计			1988500	/

九寨沟县资助标准及资金匹配表

资助标准	资助标准 (元/户)	数量(户)	合计(元)	备注
一类标准	20000	45	900000	/
二类标准	10000	138	1380000	/
三类标准	5000	18	90000	/
合计			2370000	资金不足部分由 县财政补足

项目实施完成后，由项目所在地村委会、乡镇组织专门力量严格对照《农户破旧房屋改造维修实施方案表》《农户破旧房屋改造维修预算审核表》对农房改造项目所有农户房屋进行验收，验收合格后报县扶贫局、住建局进行复核，形成《农户破旧房屋改造维修竣工验收表》。



图3 农房改造项目验收抽查

2018年7月完成九寨沟县农房改造项目第一批共计95户的材料收集和款项拨付，拨付资金1310000元；8月完成九寨沟县农房改造项目第二批共计106户的材料收集和款项拨付，拨付资金1052860.22元。

2018年8月完成平武县农房改造项目第一批共计154户的材料收集和款项拨付，拨付资金1459000.00元；9月完成平武县农房改造项目第二批共计57户的材料收集和款项拨付，拨付资金529500.00元

截至2018年10月，九寨沟县和平武县共计412户受益农户

的农房改造工作已全部完成，共计拨付项目资金4351360.22元，拨款方式为从中国扶贫基金会账户直接打款到受益农户个人账户，至此九寨沟农房改造项目结项。

2、平武县水晶幼儿园项目

根据捐赠方对于善款的使用意向及受灾地区实际需求，为改善平武县水晶镇的教育硬件设施现状，我会在水晶镇援助新建一所幼儿园。项目于2018年1月中旬进行了第一次选址考察，但由于未完成征地进行了二次选址，于2018年4月完成最终选址。前期完成了项目可研批复，项目方案设计、施工图设计、造价预算等工作。



图 4 幼儿园设计方案图

2018年7月23日完成了财评工作。

2018年7月27日进行了挂网招标。

2018年8月28日项目正常开标。

2018年9月5日在平武县科教局完成了招标单位的选取。

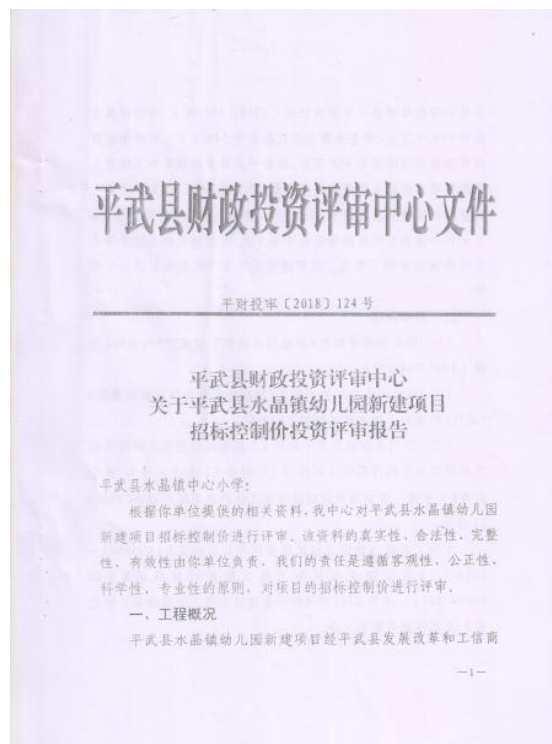


图5 平武县水晶幼儿园财评文件

招标公告			
项目编号	MYJY(2018)0348	项目名称	平武县水晶镇幼儿园新建项目
公告发布时间	2018-07-27	开标时间	2018-08-28 10:10
标书获取时间	2018-07-30 至 2018-08-03 23:59 [正在进行]		

平武县水晶镇幼儿园新建项目
标段施工
招标公告

1.招标条件

1.1本招标项目平武县水晶镇幼儿园新建项目已由平武县发展和改革委员会以平发改投资[2018]191号批准建设，项目业主为平武县水晶镇中心小学，建设资金来自县财政资金806万元，中国教育扶贫基金会捐赠资金450万元，项目出资比例为100%，招标人为平武县水晶镇中心小学。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

1.2本招标项目为四川省行政区域内的国家投资工程建设项目，平武县发展和改革委员会核准（招标事项核准文号为平发改投资[2018]191号）的招标组织形式为（自行招标委托招标）。招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为PF20180704014）的招标代理机构是华春建设工程项目管理有限责任公司。

2.项目概况与招标范围

2.1标段划分：
一个标段

2.2建设地点：平武县水晶镇任家坝村下坝组

2.3建设内容及规模：
水晶镇幼儿园新建教学用房2624.87平方米及相关附属设施，采购幼儿园办学所需设备

2.4计划工期：360日历天

图6 招标挂网截图



图7 平武县水晶幼儿园公开招标随机抽取现场会

但在2018年9月14日办理开工手续时发现了新的问题，平武县水晶镇幼儿园建设项目用地属性还未完成变更，水晶镇政府

征地无合法依据。经多次与平武县扶贫开发局沟通后，平武县扶贫开发局按照目前项目实际进展情况出具了《关于水晶镇幼儿园新建项目土地属性及征地情况的说明》、《水晶幼儿园项目甘特表》，以尽快推动项目进展。

2018年10月10日，在平武县科教局会议室完成了与中标单位成都齐合建筑工程有限公司的施工合同签订。

平武县扶贫开发局
关于水晶镇幼儿园新建项目土地属性及征地情况的说明

中国扶贫基金会：

2018年1月，水晶镇人民政府决定将水晶镇幼儿园新建项目选址确定到与场镇一河之隔的任家坝村下坝组，规划新征土地不在城镇规划区内，属于一般耕地，而非建设用地，使用该宗土地需要依法依规调整城镇建设总体规划和用地规划。2018年3月，水晶镇人民政府开始申请办理城镇建设总体规划和用地规划调整事宜。截止目前，城镇建设总体规划已经调整完毕，用地规划调整县国土资源局正在加紧报告省市国土资源部门审批。因用地规划调整批复文件没有下来，水晶镇政府征地无合法依据，涉及征用的18户农民的土地只完成9户征收协议签订，还有9户没有完成。

平武县人民政府及县扶贫开发局高度重视该项目推进工作，县政府常务副县长李学义多次督促并召集相关部门和水晶镇党委政府主要负责人研究用地规划调整工作，要求县国土资源局加快土地调规协调和用地审批，尽快完成土地征收并实现项目开工建设，早日建成水晶镇幼儿园，让水晶镇及周边地区幼儿享受更加优质的学前教育，不辜负捐资人及中国扶贫基金会对我县教育扶贫事业的大力支持！

特此说明



图8 关于水晶镇幼儿园项目用地属性和征地情况的说明

平武县水晶幼儿园项目进展甘特表																							
项目进度描述	2018年						2019年																
	11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
完成所有项目手续	■	■	■	■	■	■																	
进场施工					■																		
场地平整				■																			
开工仪式							霜冻期																
地基基础建设								■	■	■	■	■											
第一层主体建设											■	■	■										
第二层主体建设												■	■	■									
第三层主体封顶													■	■	■								
二次构筑													■	■	■	■							
外墙粉饰														■	■	■	■	■					
内部装修															■	■	■	■	■	■			
附属设施建设												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
项目竣工验收																					■	■	■
项目结项																						■	■
投入使用																						■	■

备注：以上为正常预估进展计划，如遇天气等不可抗因素进展将稍有延后。

图 9 平武县水晶幼儿园项目甘特表

2018年11月27日平武县国土资源局局长率队到四川省国土勘测规划研究院（四川省土地统征整理事物中心）催促平武县土地规划调整（修改）多个方案的编制进度，并与省中心主任就平武县城乡建设用地增减挂钩工作的进度进行沟通。

2018年12月17日，我部收到了平武县扶贫开发局提交的《绵阳市国土局关于调整平武县水晶镇土地利用总体规划（2016-2020年）的函》。

绵阳市国土资源局

绵国土资函〔2018〕565号

绵阳市国土资源局 关于调整平武县水晶镇土地利用总体规划 (2006—2020年)的函

平武县人民政府:

你县《关于调整平武县水晶镇土地利用总体规划的函》(平府函〔2018〕250号)收悉。按照《土地利用总体规划管理办法》(国土资源部令第72号)的规定。经研究,意见如下:

一、原则同意调整平武县水晶镇土地利用总体规划(2006—2020年)。

二、同意调出平武县水晶镇规划建设用地指标0.7734公顷(非永久基本农田耕地0.7734公顷)。调出地块应补划为有条件建设区,不再作为规划建设用地;

三、同意调入水晶镇土地0.7734公顷(非永久基本农田耕地0.7734公顷),调入地块作为规划建设用地,具体位置以批准的水晶镇土地利用总体规划调整方案图为准。

四、平武县水晶镇土地利用总体规划调整不得变更基本农田位置,不得占用基本农田,耕地保有量不得减少。

五、各类建设用地必须严格按照批准的规划执行。



绵阳市国土资源局办公室 2018年12月13日印发

- 2 -

图 10 绵阳市国土局关于调整平武县水晶镇土地利用总体规划(2016-2020年)函
2018年12月21日,平武县国土局工作人员在省国土资源厅
完成用地手续办理工作。

2018年12月24日中午，平武县水晶幼儿园新建项目开工仪式在平武县水晶镇举行。仪式由水晶镇党委书记张仁斌主持，百胜中国代表刘晶，平武县委常委、常务副县长李学义，平武县扶贫开发局局长陈廷斌，县科教局局长陈凤春，县住建局质检站站长龚贤斌，水晶镇镇长龙昌武、水晶镇中心小学校长张雄等代表、项目管理部伍晨晨参加开工仪式。



图 11 开工仪式现场 1



图 12 开工仪式现场 2



图 13 开工仪式现场 3



图 14 开工仪式现场 4

相关报道链接:

<http://mob.zbmy.myntv.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=181&id=167970&from=singlemessage&isappinstalled=0> (直播平武/平武县广播电视台)

http://sc.china.com.cn/2018/mobile_yuanchuang_1228/303618.html (中国网)

<https://mianyang.scol.com.cn/m/jy2/201812/56778768.html?from=timeline> (四川在线)

<http://my.newssc.org/system/20181228/002584818.html> (四川新闻网)

3. 溪桥工程项目

九寨沟地震受灾地区多为山区，地形崎岖、水系众多、基础设施建设薄弱，民众出行难度大，多雨时期生产、出行都会受到影响，对溪桥的需求较为明显。为改善灾区群众出行现状，

目前已确认在受灾地区援建14座溪桥。其中，广发证券在平武县援助的2座溪桥已于11月份竣工结项；湘财证券在平武县的10座溪桥、山西证券在平武县的2座溪桥已于12月开工建设。



图 15 广发证券高家沟溪桥竣工图



图 16 山西证券杜家院溪桥开工图

4. visa培训项目

九寨沟景区因6月暴雨再度关闭至今。鉴于九寨沟景区一直处于闭园状态，为推动项目进展，结合地方需求，我会积极与捐赠方沟通，在捐赠方的大力支持下成功于2018年12月11-15日在成都举办了重建四川九寨沟，共筑世界旅游目的地——旅游扶贫干部领导力培训班。Visa公司中国区企业传播部总经理郑静娴，中共九寨沟县委常委、副县长李治波出席活动并讲话，Visa公司中国区普惠金融及教育负责人、高级总监王东，九寨沟县旅游发展局副局长欧娅及九寨沟旅游扶贫相关单位、县域旅游企业负责人共计36人参加培训班。此次培训班邀请到

成都理工大学旅游与规划学院、中山大学旅游学院、中国工商银行四川省分行多位业界专家为学员授课，此次培训讲授了旅游监测体系建设与研究发现，乡村旅游发展新理念、新业态、新举措，乡村旅游产品开发等课程，授课老师给学员们授课并针对学员们提出的问题进行了现场指导与答疑。课后学员们表示：此次培训班内容针对性强，互动式的教学方法让大家更容易理解并接受授课内容，除了知识上的提升，也增强了大家对九寨沟灾后重建工作的信心。



图 17 重建九寨沟，共筑世界旅游目的地旅游扶贫干部培训班学员合影



图 18 培训班现场



图19 Visa公司中国区企业传播部总经理郑静娴女士与学员交流

5. 爱心包裹项目

根据捐赠方善款使用意向及受灾地区实际需求，为平武县高村乡中心小学等24所小学生发放价值200元的学生型温暖包裹共2250个，2017年12月31日完成所有包裹发放工作。

受益学校名单及发放照片如下：

广发证券捐赠 45 万元九寨沟地震温暖包受益学校名单					
序号	省	市	县	学校名称	学生数量
1	四川省	绵阳市	平武县	平武县豆叩镇中心小学校	219
2	四川省	绵阳市	平武县	平武县高村乡中心小学	177
3	四川省	绵阳市	平武县	平武县虎牙藏族乡中心小学	88
4	四川省	绵阳市	平武县	平武县黄羊关藏族乡中心小学	12
5	四川省	绵阳市	平武县	平武县旧堡乡中心小学	69
6	四川省	绵阳市	平武县	平武县木皮藏族乡中心小学	11
7	四川省	绵阳市	平武县	平武县木座藏族乡中心小学	38
8	四川省	绵阳市	平武县	平武县南坝镇高庄中心小学校	28
9	四川省	绵阳市	平武县	平武县南坝镇石坎中心小学校	100
10	四川省	绵阳市	平武县	平武县平南乡中心小学校	51
11	四川省	绵阳市	平武县	平武县平通镇桥头中心小学校	46
12	四川省	绵阳市	平武县	平武县水观乡中心小学校	34
13	四川省	绵阳市	平武县	平武县水晶镇水柏中心小学校	69
14	四川省	绵阳市	平武县	平武县水晶镇叶塘中心小学校	62
15	四川省	绵阳市	平武县	平武县水晶镇中心小学	619
16	四川省	绵阳市	平武县	平武县水田乡中心小学	77
17	四川省	绵阳市	平武县	平武县泗耳藏族乡中心小学	3
18	四川省	绵阳市	平武县	平武县锁江乡赤水中心小学	30
19	四川省	绵阳市	平武县	平武县锁江乡中心小学	132
20	四川省	绵阳市	平武县	平武县土城乡海河中心小学校	24
21	四川省	绵阳市	平武县	平武县土城乡中心小学	102
22	四川省	绵阳市	平武县	平武县响岩镇中心小学校	163
23	四川省	绵阳市	平武县	平武县徐塘乡中心小学	60
24	四川省	绵阳市	平武县	平武县古城镇中心小学校	36
总计					2250



图19 爱心包裹发放

6. 百美村宿项目

中国三星集团通过我会向九寨沟灾区捐赠善款，用于九寨沟地震受灾地区灾后重建工作。平武县为九寨沟地震的严重受灾县，经过多方友好协商，最终确定在平武白马藏族乡伊瓦岱

惹村实施百美村宿项目，以期实现平武县灾后重建与生计恢复发展相结合。

经过我会的积极推进，目前完成项目村庄整体规划设计，并先后与于6月、9月、12月先后三次向平武县人民政府及相关部门做了总规以及民宿设计方案汇报，得到了当地政府及相关部门的认可；另外项目完成白马藏族乡伊瓦岱惹村旅游专业合作社的组建、注册工作，选举村内能人到任理事、监事，发挥能人的积极带动效果；项目本年度内完成了项目改造房屋的流转工作；并先后引导4个潜在民宿运营团队进行了调研考察，洽谈合作。



图20 8月份，召开项目推进会

虽然各项工作均有所进展，但是由于本年度7月份，平武县再次发生特大洪水灾害，造成九环线中断一个月，进入村庄的道路时断时通，道路危险系数较高。这些对项目的现场测绘、房屋场地勘察等工作带来了十分不利的影响。加之，10月份伊瓦岱惹村上壳子社老房屋被列入白马文化保护村落，当地政策发生变化，导致11月份开始项目将民宿改造区调整到伊瓦岱惹村驮骆加一二社，因而重新开展民宿房屋测量及设计工作。截止目前，伊瓦岱惹村驮骆加一二社总体规划以及民宿设计方案已经得到当地政府认可，规划设计单位目前正在绘制施工图。预计2019年开春以后，可以开工实施。



图21 12月份，召开伊瓦岱惹村骆驼加一二社规划设计汇报会

7、校园减灾教室项目

通过公开竞争性谈判方式，确定2018年九寨沟校园减灾教室项目供应商。确定九寨沟、平武8所受益项目学校，并进行实地调研和测量。12月2日，完成校园减灾教室样板间与验收工作。项目支出711029.6元，直接受益师生3858人。

校园减灾教室项目受益学校名单

序号	学校名称	学校地址	在校学生	面积
1	九寨沟县永和小学	九寨沟县永和乡	149	50
2	平武县阔达小学	平武县阔达藏族乡	249	42
3	平武县北山小学	平武县县城	813	50
4	平武县涪江小学	平武县县城	838	50
5	平武县南坝小学	平武县南坝镇	770	54
6	平武县平通小学	平武县平通镇	473	57

7	平武县豆叩小学	平武县豆叩镇	232	49
8	平武县大桥小学	平武县大桥镇	334	59



图 22 校园减灾教室项目样板间

8、第一救援人项目

“第一救援人”项目是中国扶贫基金会在借鉴国际社区减灾建设经验基础上，结合中国社区减灾建设的紧迫需求而推出的本土化扶贫减灾能力建设项目。该项目针对社区减灾教育这一软档，培养具有家园安全意识、社区备灾防灾知识和医疗急救等救灾技巧的志愿者或社区骨干，使其具有平时投入减灾社区建设、灾时能进行即时、就地的非专业救援的能力。

2018年，九寨沟第一救援人项目累计支出842180元，项目覆盖九寨沟县漳扎镇、大录乡、玉瓦乡、黑河乡、保华乡、永和乡、罗依乡、郭元乡、勿角乡九个乡镇，直接受益人数2051人，培养第一救援人教官培50人，43名教官通过考试取得国际应急管理学会师资认证，受益社会组织超过25家。接受过培训的教官在九寨沟的9个乡镇及行政村开展第一救援人培训，直接参加培训人次300人，间接受益村民超过2.5万人。



图 23 乡镇学员进行灭火演练



图 24 教官向乡镇学员演示不同打法的绳结



图 25 教官组织开展学员实操应急演练

9. 电商扶贫项目

依据本项目的目标-通过恢复农村生计、培育当地农民合作经营组织、提高组织自我生产与恢复能力并建立其与市场的链接，综合推动九寨沟地震地区地震灾区社区的经济恢复，与受灾地区的需求，通过前期的深入调研，按照项目管理要求选定平武县木皮乡小河村养蜂专业合作社作为首个项目扶持的产业生计发展合作社，之后项目会逐步加大对周边其他农民专业合作社进行覆盖和扶持。

2018年10月至12月，合作社进入年底总结与生产收尾的阶段。随着冬季的来临，蜂农们在蜂箱的缝隙处涂抹牛粪给蜂箱保温，帮助蜂群顺利的过冬，也期待来年蜂蜜的好收成。合作社于12月20日召开全社员大会，理事会向社员汇报近期的工作、公益资金的使用方向与使用情况，会议现场征求社员的意见，是否要尝试改良生产方式，一起探讨新的技术，经过社员的同意，现场统计加入生产改良的养蜂户名单，由生产小组组长陈顺平负责采购。开年后，将以报名情况发放，并合作社内部定期组织新技术交流活动，为周边养蜂户提供服务做好技术经验积累。

依据项目支持内容和本地的产业发展需求,经过多方协调和沟通,选定合作社建造蜂蜜加工厂地址、寻找咨询公司,年后正式启动蜂蜜加工厂建设工作。2019年蜂蜜加工厂的建设将为周边3~4个社区(500~600户)的养蜂产业带来产业升级的机会,提升产品附加值,打造本地的蜂蜜品牌。为合作社培养人才的同时,产生更多的就业机会,为社区青年人的返乡制造机会。

为了扩大项目收益范围,并支持周边蜂蜜产业的发展,走访临近的新驿村与金丰村考察了解社区的养蜂情况,走访社区带头人调研的同时说明电商扶贫项目的初衷,建立联系,为后续项目开展做铺垫工作。



图 26 传统的“棒棒巢”取蜜时只能连带蜂卵一起取出,对蜂群数量有一定的影响,

尝试选用“格子箱”降低对蜂卵的伤害。也需要合作社养蜂户摸索出随之而来的新的养蜂技术。



图 27 使用牛粪封住蜂箱的缝隙保温，帮助蜂群顺利过冬。

资金使用情况：

	支出项	支出	使用说明
2018 年使 用	差旅费	15,583.86	项目工作人员差旅费用
	捐赠协议（首付款）	81,000.00	合作社捐赠协议中的第一笔项目资金，主要用于合作社办公室建设、基地标识标牌制作、技术改良支持等方面
预计 2019 年使 用	捐赠协议(余款)	189,000.00	
	建设加工厂	600,000.00	
	营销推广及品牌打造	500,000.00	通过支持社会企业执行。
	运营管理能力建设	500,000.00	严格按照项目建议书约定的
	运营支持	235,645.25	资金使用方向执行。
	总计	2,121,229.11	

10、暖冬行动项目

我会于2018年4月完成家庭保障箱采购招标工作，确定成

都百隆家纺有限公司为我会2018-2019年家庭保障箱中标供应商,广发证券捐赠的1136个家庭保障箱于2018年9月开始生产,并于2018年10月完成验收入库工作,计划于2019年完成物资发放工作。



11、弘慧行知教育项目

与弘慧教育发展基金会合作，开展“弘慧行知教育项目”，计划通过“积极心理学大咖西部行”组织国内幸福教育积极心理学教育名师为120名九寨沟的教师进行教学交流和实践；并选拔组织区域骨干成员到行知教育发达地区的学校进行参访；提高教师的幸福感和学会培养幸福的学生；促进校长建立幸福的教育体系和校园文化。项目资金43.2万元。目前处于项目书确认阶段。
